
PAVIMENTO GARAGEM | CAD B04


Eixos reconciliados com G02 / R08 | cotas em metros | corte e aberturas preservados

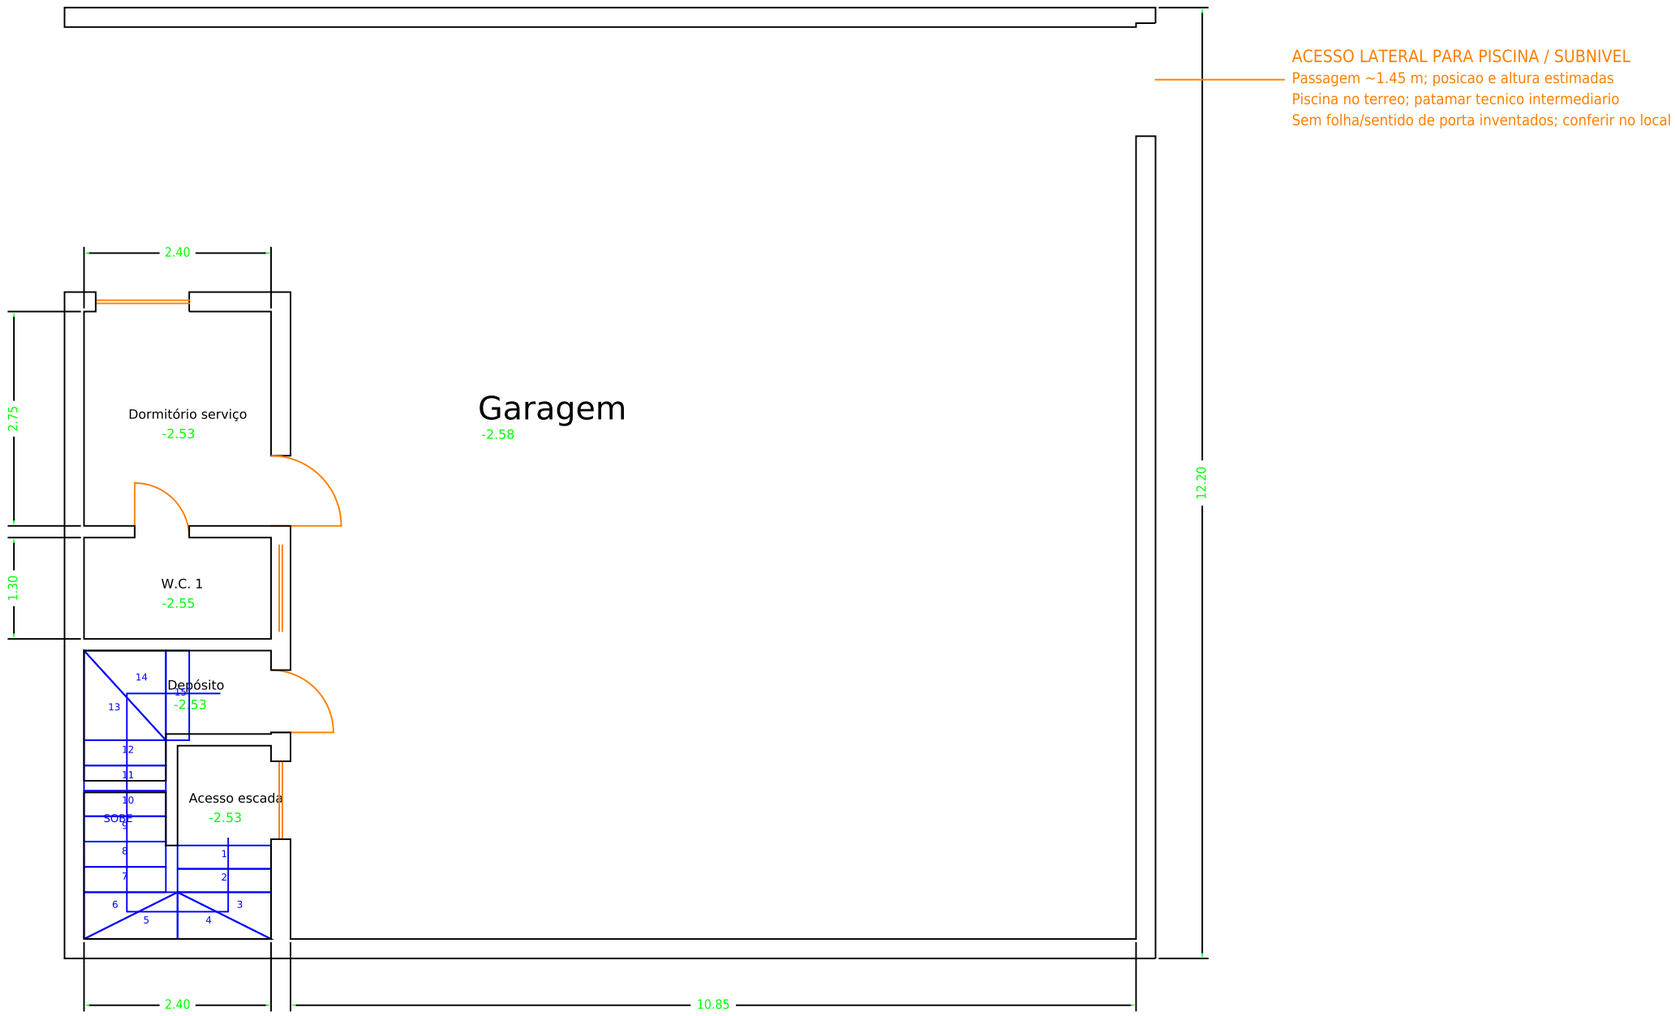

GARAGEM B04 | Reconstrução por cotas e eixos. Não é levantamento executivo.
Base G02/R08 preservada. Mesmo referencial XY. Laje única, sem placas por cômodo.
Garagem: fonte −2.58; norte/rampa −2.63. Quarto/depósito −2.53; WC −2.55.
Escada separada: inicia à direita, contorna ao sul e sobe à esquerda; 13/14 diagonais, 15 reto.
Hipótese: 15 pisos + patamar, 16 espelhos de .18, ligando −2.53 a +.35. Confirmar em campo.
Depósito: principal 2.40 × 1.07; dente 1.05 × .60. Limites marcados pelo usuário preservados.
Teto acompanha o intradorso até o fim da escada, inclusive 13/14/15, conforme confirmação do usuário.
Porta de acesso à escada de CORRER/aberta, sem giro contra degraus, conforme usuário.
Paredes mantidas acima e abaixo das janelas. Espessuras e posições não cotadas são estimadas.
Patamar do novo combinado: borda x0 → .15 para o piso 15. Arquivo G02 não foi alterado.
Garagem 10.85 entre x1.45 e12.30. Parede do bloco .25 inferida; face interna da escada x1.20.
Acesso lateral piscina/sauna representado por fotos: posição e dimensões aproximadas a conferir.
Duto da lareira sem volume, posição pendente. Rampa/arrimos e interpolação de níveis a conferir.

PAVIMENTO TÉRREO | CAD G03

Eixos comuns ao superior R08 | fonte IMG_2212/2213 | PDF exportado do DXF

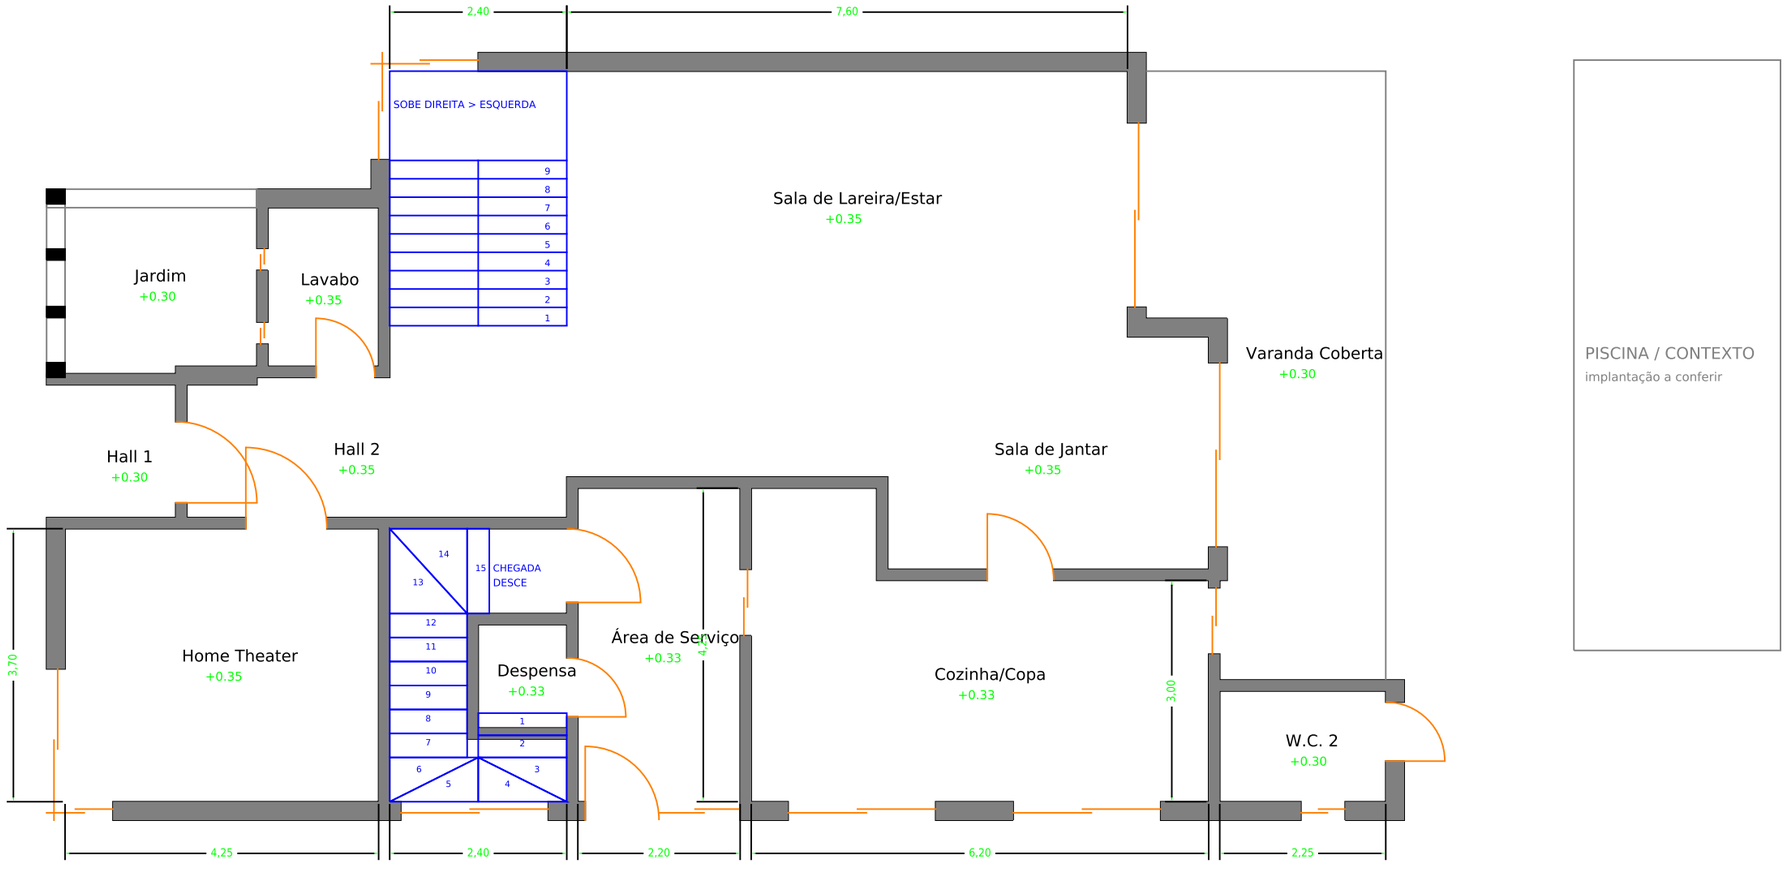


TÉRREO G03: reconstrução CAD por cotas, eixos e encontros. Não é levantamento executivo.
Mesma origem XY do superior R08. Cotas Z absolutas do projeto: superior+3.59; térreo por ambiente.
Paredes externas.25/internas.15 inferidas. Eixos comuns alinhados; recuos reais preservados.
Salas e Hall2 comunicam sem paredes artificiais. Fronteira de pisos entre salas é só funcional.
Escada principal única no modelo combinado; começa à direita e chega à esquerda, vazada, conforme usuário.
Duto lareira: POSIÇÃO PENDENTE. Sem volume ou marcador perto/embaixo da escada.
Acessos às varandas e cozinha-serviço de CORRER conforme usuário; larguras não cotadas estimadas.
Escada da garagem compatibilizada B02: 13/14 diagonais; 15 reto; patamar x+.15..1.20.
Janelas conservam paredes abaixo e acima. Posições e pernas das esquinas sem cotas são estimadas.
Home, salas, Hall2/lavabo +.35; cozinha/serviço +.33; Hall1/varanda/WC2 +.30.
Altura livre Home/WC2 3.09 e cozinha/serviço3.11 lidas nos cortes; demais adotadas até teto+3.44.
WC2: teto acabado da fonte+3.39; forro/rebaixo local não modelado, topo estrutural comum+3.44.
Piscina e pátio são contexto externo, separados da geometria do térreo; dimensões de implantação a conferir.
Recuo leste salas: x8.80 para x9.90, ressalto1.10; living7.60 entre escada e fachada.
Varanda: cota impressa2.50 aplicada; anotação manuscrita230 divergente, conferir.
Esquadria Home em L: leitura visual; pernas1.80/.65 estimadas. Confirmar em as-built.

G02: laje única por pavimento, sem placas independentes por cômodo; desníveis e vazios preservados.
Jardim:4 colunas em linha oeste. Vãos.61/.63/.61; seção transversal.25; extremas.20, internas.15 inferidas.
G03: única mudança de laje = recuo da borda do patamar x0 para x+.15, y2.55..3.70; G02 arquivado.

PAVIMENTO SUPERIOR | CAD R08

Geometria unificada por pavimento | validação por cômodo | PDF exportado do DXF

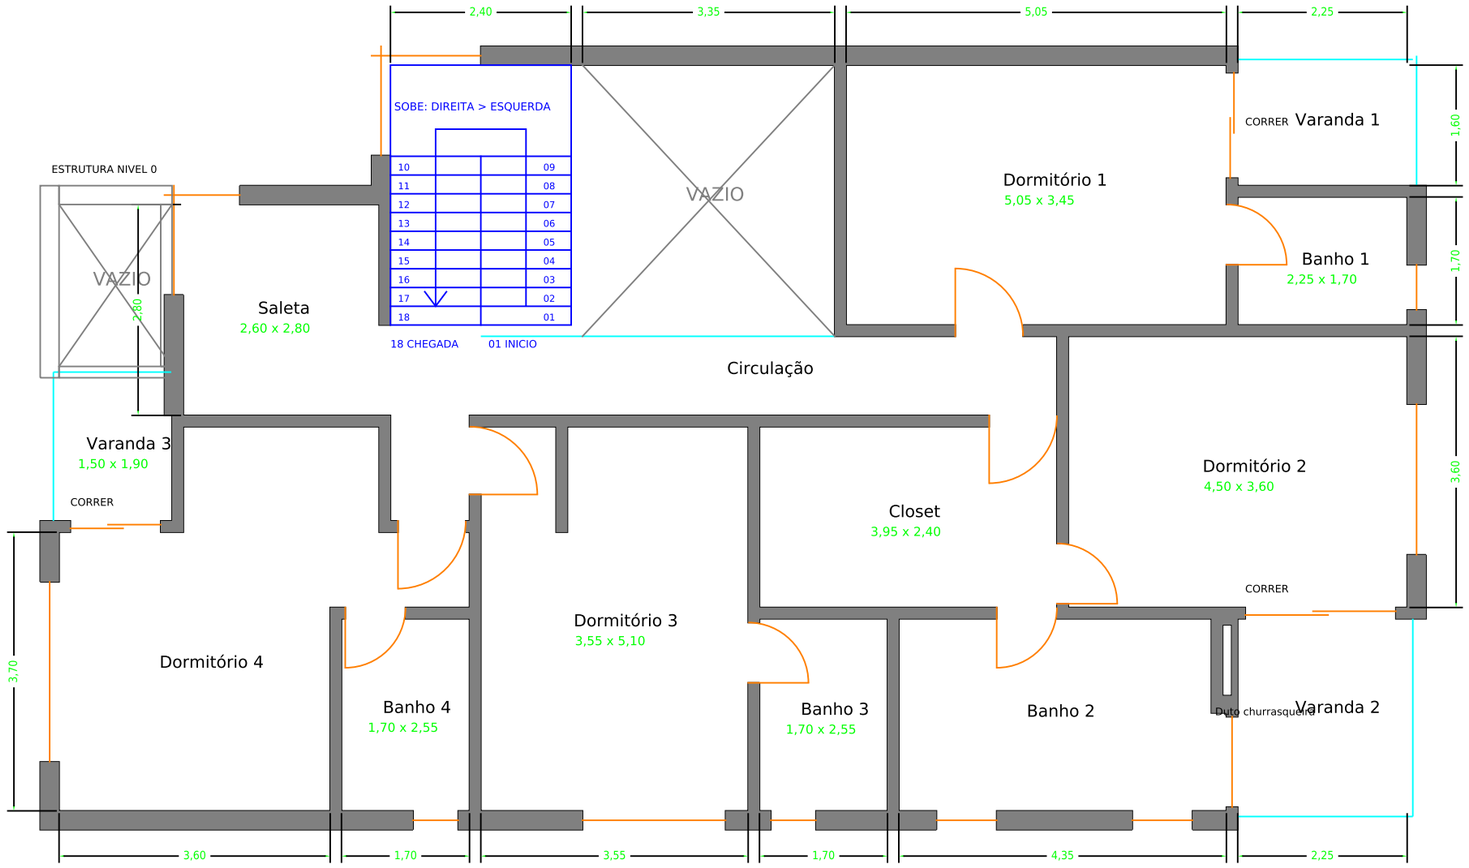


Paredes internas0.15m e externas0.25m inferidas por cotas. Quartos2.70m: cortes A-A/C-C; banhos2.72m: A-A.
Portas sem cota: largura0.80/0.90m, posição e altura estimadas. Janelas cotadas; posições aproximadas.
Banho2 tem ressalto0.20m; posiçãoY=1.30m e duto esquemáticos. Não confundir1.20m do box com ressalto.
Escada AS-BUILT: começa à DIREITA no piso inferior e chega à ESQUERDA no superior, conforme usuário.
Corte B-B: pisos+.35/+3.59, patamar+1.97; desnível3.24m, 18espelhos de.18m. Térreo integrado no modelo combinado.
Circulação AS-BUILT reta, sem curvatura. Guarda-corpo e piso corrigidos; vazios sem piso.
Janela escada: anotação2.90x4.74m; altura relativa−2.64..+2.10m. Não são2.90m confirmados por perna.
Cotas gerais18.40x10.40 fecham com internas0.15m/externas0.25m; espessuras inferidas, sem levantamento.
Escada vazada e corrimãos metálicos confirmados pela foto real; espessura de degraus0.07m apenas visual.
Bordas livres do vazio lateral sem parapeito; vidro norte da Varanda 3 preservado. Contorno estrutural no nível do piso.
AS-BUILT: guarda-corpos de todas as três sacadas em vidro, conforme usuário; ferragens ilustrativas.
R08: todos os três acessos às varandas são portas de correr, conforme usuário. Saleta com L menor no canto noroeste, não janela ocupando toda parede.
Saleta: anotação2.45x1.50,p=.60; pernas internas.75/1.20m estimadas. Janela distinta da alta janela da escada.
Duto lareira: POSICAO PENDENTE. Sem geometria ou marcador; conferir no as-built.
Janela L na escada: configuração sugerida pelo usuário e traço da foto; pernas internas1.20m estimadas, conferir.
Varanda1: leitura1.60m adotada; anotação1.50m também visível, confirmar. Planta documental, não executiva.

R08: laje estrutural única. Face inferior comum+3.44; superfícies+3.59/+3.57/+3.54, sem placas por ambiente.
Borda oeste do vazio alinhada aos4 apoios do Jardim. Vazio livre preservado; geometria de apoio parcialmente inferida.

AQUARIUS530 | COBERTURA C04 - REVISAO

Base CAD ortogonal conciliada + estudo fotográfico separado. NÃO É LEVANTAMENTO AS-BUILT.


R10: abertura na mureta de R09

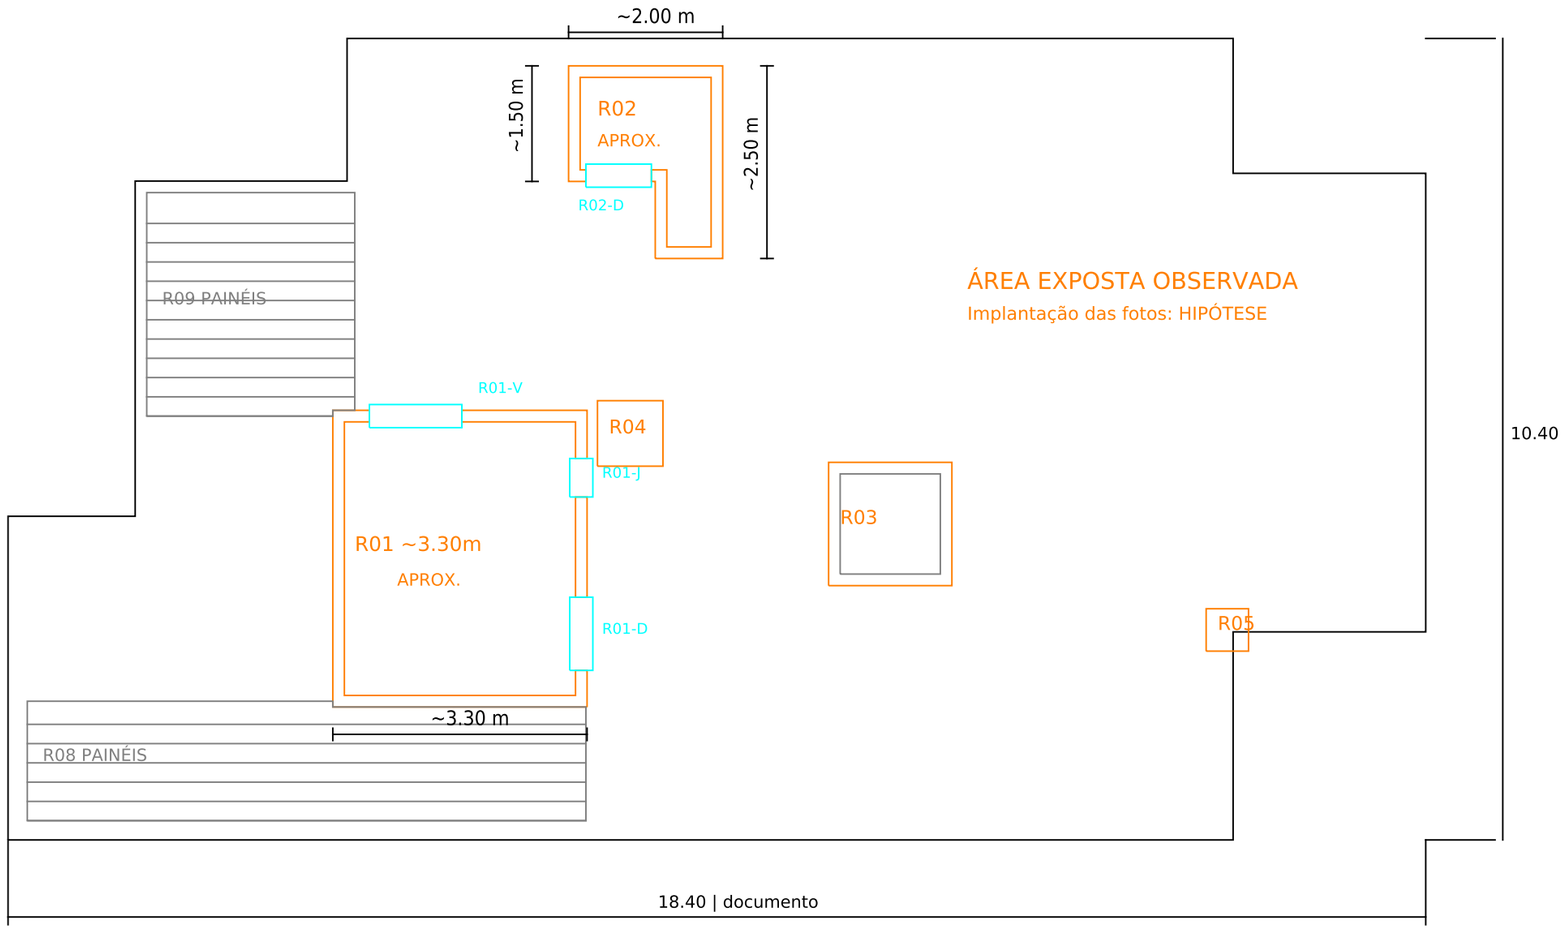

PRETO: contorno e níveis documentais. OCRE: posição/forma aproximadas a confirmar. CINZA: painéis, não piso transitável.
Laje documental +6.29 a +6.44; platibanda histórica +7.34. R01 +8.74 e R02 +9.09 usados apenas no estudo aproximado.
R01 porta + janela + veneziana; R02 porta + painel OPACO em rebaixo; R03/R04 ressaltos com tampa aparente envidraçada.
R01 ~3.30m: aproximacao restaurada; referencia historica do reservatorio nao certifica o volume atual. R02 ~2.00m aprovado.
Contorno histórico concilia os eixos R08; varandas descobertas não recebem cobertura fictícia. Registro das fotos é hipótese.
R03: domus histórico 1.30 x 1.30 (furo na base). Associação ao ressalto atual não confirmada. R04: término inferior desconhecido.
R08/R09: cobertura de painéis observada; material, apoio, ligação entre faixas e continuidade da laje abaixo não verificados.
Não inventados: nova escada, uso interno de R01/R02, divisórias ocultas, rede hidráulica, caimentos, acesso ou cargas admissíveis.
Não foi adotado como atual o telhado inclinado de zinco/madeira da planta antiga. Alterações posteriores são evidentes nas fotos.
Fontes: IMG_2216/2217/2218, fotos IMG_2740-2761 e foto aproximada enviada em 21/10/2026 (R02 e parapeito).
R02: largura 2.00m; profundidades ~2.50 / ~1.50m. Borda posterior mantida; cornija contida em Ymax=9.90.
PDF/SVG exportados diretamente deste DXF salvo e reaberto; unidades CAD em metros. Cotas fotográficas aproximadas não ocultadas.

EXTERIORES F02 - BASE DOCUMENTAL + CORRECOES DO USUARIO

Coordenadas em metros, mesma origem dos quatro pavimentos. Nao e levantamento medido.

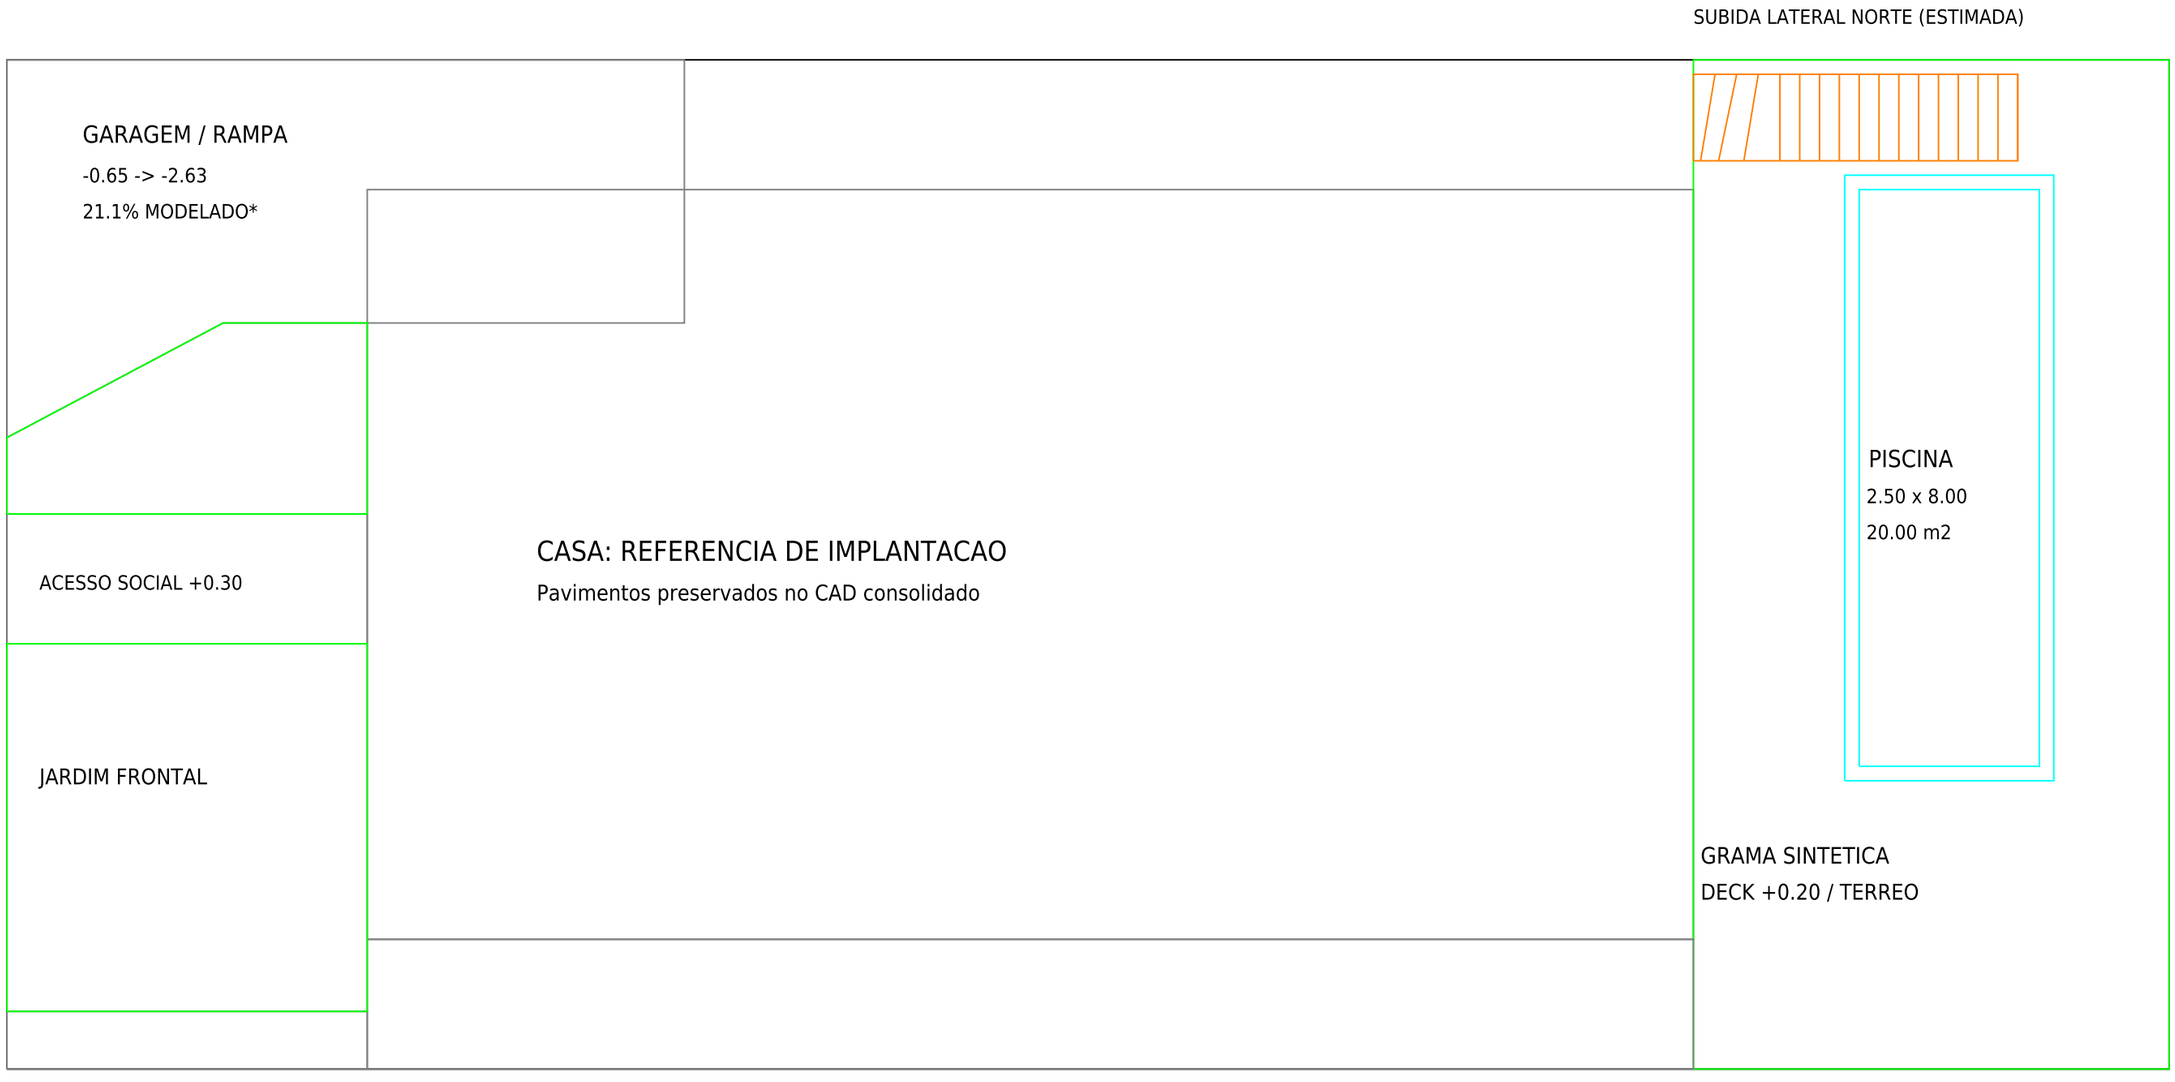

PISCINA: dimensoes historicas 2.50 x 8.00. Piso externo +0.20 no nivel terreo; agua ilustrativa +0.05.

ESTADO ATUAL: grama sintetica, terraco plano, muros laterais claros e guarda-corpo metalico posterior pelas fotos.

ACESSO NORTE: primeiro lance em leque, patamar tecnico e segundo lance aberto. Numero/cotas dos degraus estimados.

RAMPA: conecta -0.65 a -2.63 em 9.40 m. Fontes historicas divergem 19%/20%; modelo resulta 21.1%. Conferir em campo.

LIMITES: jardim/terreno e implantacao exata do acesso sao aproximados. Nenhuma geometria e projeto executivo.
